


Rantaroustin kouluhanke – viikko 25

Naapurikiinteistöjen katselmukset ovat päättyneet. EHA- lohkon anturamuottien teko on käynnissä ja ensi viikolla valetaan anturat. 3-4- lohkon pilari- ja sokkeli- elementtien asennus käynnissä, mikä etenee aikataulun mukaisesti. Piha-alueella parkkipaikkojen ja rakennekerrosten teko. Keittiön putkien, taito- lohkon viemäreiden ja sähkösyöttökaapelin asennus jatkuu. VSS rauditus- ja laudoitustyöt jatkuvat.

Keittiöön asennettu ontelolaatat



Rakennus alkaa saamaan jo muotojaan

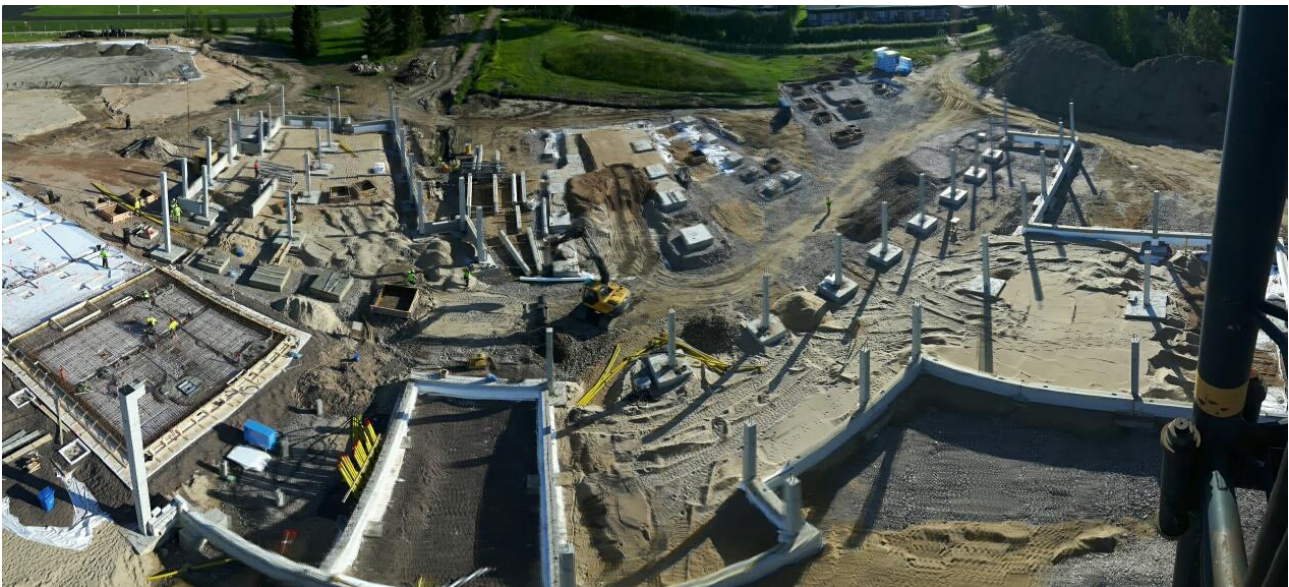

Raudoitus- ja sirkkelyöpiesteet

