


# Rantaroustin kouluhanke – viikko 9

---

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Lattioiden pinnoittamistyöt jatkuivat 5-6- ja 3-4- lohkoilla akryylipinnoitteiden asennuksella. 5-6- lohkon lattian pinnoitustyöt valmistuvat viikon 8 lopulla. 3-4- lohkoilla pinnoitettavien lattioiden pinnoitustyöt aloitettiin. Keittiössä LV-putkitukset jatkuivat. Vedeneristys- ja laatoitustyöt jatkuvat EHA- ja VSS- lohkoilla. Maalaus- ja tasoitustyöt jatkuvat aulan seinien tasoitus- ja maalaustöillä, 3-4- ja Taitolohkon wc:n kattojen tasoitus- ja maalaustöillä Alakattotyöt jatkuivat EHA- lohkolle runkojen ja tekniikkalevyjen asennuksen myötä. IVKH:ssa iv- ja putkiasennukset jatkuvat. Raitisilmakammio saatiin pääosin valmiiksi. Panelointityöt jatkuvat EHA- lohkon osalle. Cembrit julkisivujen levytystyöt jatkuvat Taito-osan töillä. Laatikko- ja roskakatoksien rakentaminen jatkuu niiden levytyksillä.

5-6- lohko

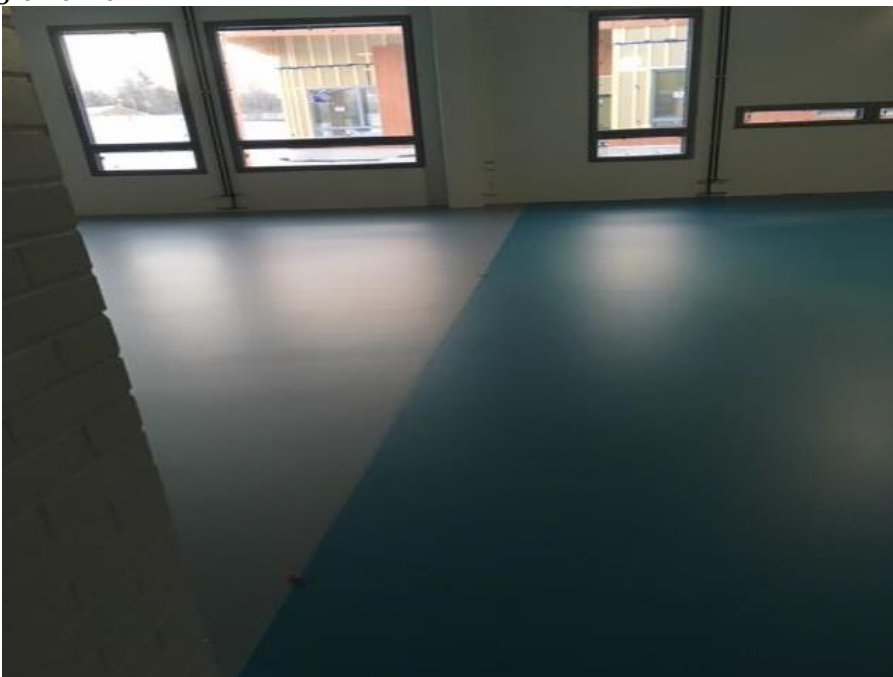

Opettajanhuone

